

Postup výstavby:

1. etapa

V rámci 1. etapy budou realizovány stavební práce v úseku km 0,000 00 - 0,543 00. Stavba bude realizována za vyloučení provozu. Přes uzavřený úsek silnice bude umožněn příjezd ve směru od Přerova a Ujezdce, dopravní obsluha z autobusů. Ve směru od Horní Moštěnice bude umožněn výjezd pouze autobusem. Provoz pro osobní auta a nákladní automobily ve směru Přerov-Ujezdec bude přeměňován na komunikaci v ul. Přerovské, z opačného směru (od Horní Moštěnice) pak bude příjezd do Ujezde řešen ulicí Hlavní. Výjezd vozidel dopravní obsluhy z přílehlých provozoven bude dopravními značkami usměrněn ve směru na Horní Moštěnici. V ostatních úsecích bude provoz beze změn.

Postup výstavby v 1. etapě

1. Odstranění asfaltového souvrství a část vstavy cem, stabilizace v úseku mezi km 0,17795 - 0,54300 v pravém jízdním pruhu. Nulto zajistit příjezdy do provozoven na pravé straně komunikace a výstup z autobusů.
2. Provedení propustku v km 0,01323
3. Provedení konstrukčních vstev vozovky po obrusnou vstřvu v pravém jízdním pruhu.
4. Odstranění asfaltového souvrství v předepsané tloušťce v úseku mezi km 0,000 - 0,17795.
5. Odstranění asfaltového souvrství a část vstavy cem, stabilizace v úseku mezi km 0,17795 - 0,54300 v levém jízdním pruhu. Nulto zajistit příjezdy do provozoven na levé straně komunikace a výstup z autobusů.
6. Provedení konstrukčních vstev vozovky po obrusnou vstřvu v úseku 0,00000 - 0,17795 a v levém jízdním pruhu, km 0,17795 0,54300

2. etapa

V rámci 2. etapy budou realizovány stavební práce v úseku km 0,543 00 - 0,979 00. Stavba bude realizována za vyloučení provozu. Přes uzavřený úsek silnice bude umožněn příjezd ve směru od Přerova vozidly stávy, dopravní obsluha z autobusů.

Ve směru od Horní Moštěnice bude umožněn výjezd pouze autobusem. Provoz pro osobní auta a nákladní automobily ve směru Přerov-Ujezdec bude bez omezení, z opačného směru (od Horní Moštěnice) pak bude usměrněn dopravními značkami přes opravny úsek 1. etapy. Výjezd vozidel dopravní obsluhy z přílehlých provozoven bude dopravními značkami usměrněn ve směru na Horní Moštěnici. Postup výstavby v 2. etapě

1. Odstranění asfaltového souvrství a část vstavy cem, stabilizace v úseku mezi km 0,543 0 - 0,979 00 v pravém jízdním pruhu. Nulto zajistit příjezdy do provozoven na pravé straně komunikace.
2. Provedení pravé polokružní propustky v km 0,881 00.
3. Provedení konstrukčních vstev vozovky po obrusnou vstřvu v pravém jízdním pruhu.
4. Odstranění asfaltového souvrství a část vstavy cem, stabilizace v úseku mezi km 0,543 0 - 0,979 00 v levém jízdním pruhu.
5. Provedení levé polokružní propustky v km 0,881 00.
6. Provedení konstrukčních vstev vozovky po obrusnou vstřvu v levém jízdním pruhu.

3. etapa

V rámci 3. etapy budou realizovány stavební práce v úseku km 0,979 00 - 1,264 00. Stavba bude realizována za úplného vyloučení provozu. Dopravní obslužnost stavební Formál bude zajištěna ze směru od Horní Moštěnice.

Postup výstavby v 3. etapě

1. Odstranění asfaltového souvrství a část vstavy cem, stabilizace v úseku mezi km 0,979 00 - 1,264 00 na celou šířku vozovky.
2. Provedení propustku v km 1,142 00.
3. Provedení konstrukčních vstev vozovky po obrusnou vstřvu na celou šířku vozovky
4. etapa


V rámci 4. etapy budou realizovány stavební práce v úseku km 1,264 00 - 1,630 03. Stavba bude realizována za úplného vyloučení provozu. Dopravní obslužnost stavební Formál bude zajištěna ze směru od Přerova.

Postup výstavby v 4. etapě

1. Odstranění asfaltového souvrství a část vstavy cem, stabilizace v úseku mezi km 1,264 00 - 1,630 03 na celou šířku vozovky.
2. Provedení konstrukčních vstev vozovky po obrusnou vstřvu na celou šířku vozovky
5. etapa

V rámci 5. etapy bude realizována obrusná vstřva. Práce budou probíhat při úplné uzavírací. Dokončovací práce budou realizovány za částečné uzavírky. Výjezd bude umožněn pouze dopravní obsluha z autobusů.

III/0555 PŘEROV, UL. 9. KVĚTNA	KOFIE:
UNĚSTĚNĚ: PŘEROV, UL. 9. KVĚTNA	
STAVEBNÍK: SPRÁVA SILNIC OLOMOUCKÉHO KRAJE, P.O., LPEŇSKÁ 120, 772 11 OLOMOUČ	
PROJEKTANT: PRINTES - ATELIER s.r.o., MOSTNÍ 1876/11a, 750 02 PŘEROV	
STUPEŇ PD: ZÁKAZKA:	DATAUM: LEDEN 2016
OSP-OPS	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKANT: KONTROLOVAL: Ing. Jan Štoký Ing. Jan Štoký	ZPRACOVAL: Ing. Jan Štoký
ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY	
PŘEHLEDNÁ SITUACE	M 1 : 2500
	VÝKRES: 001

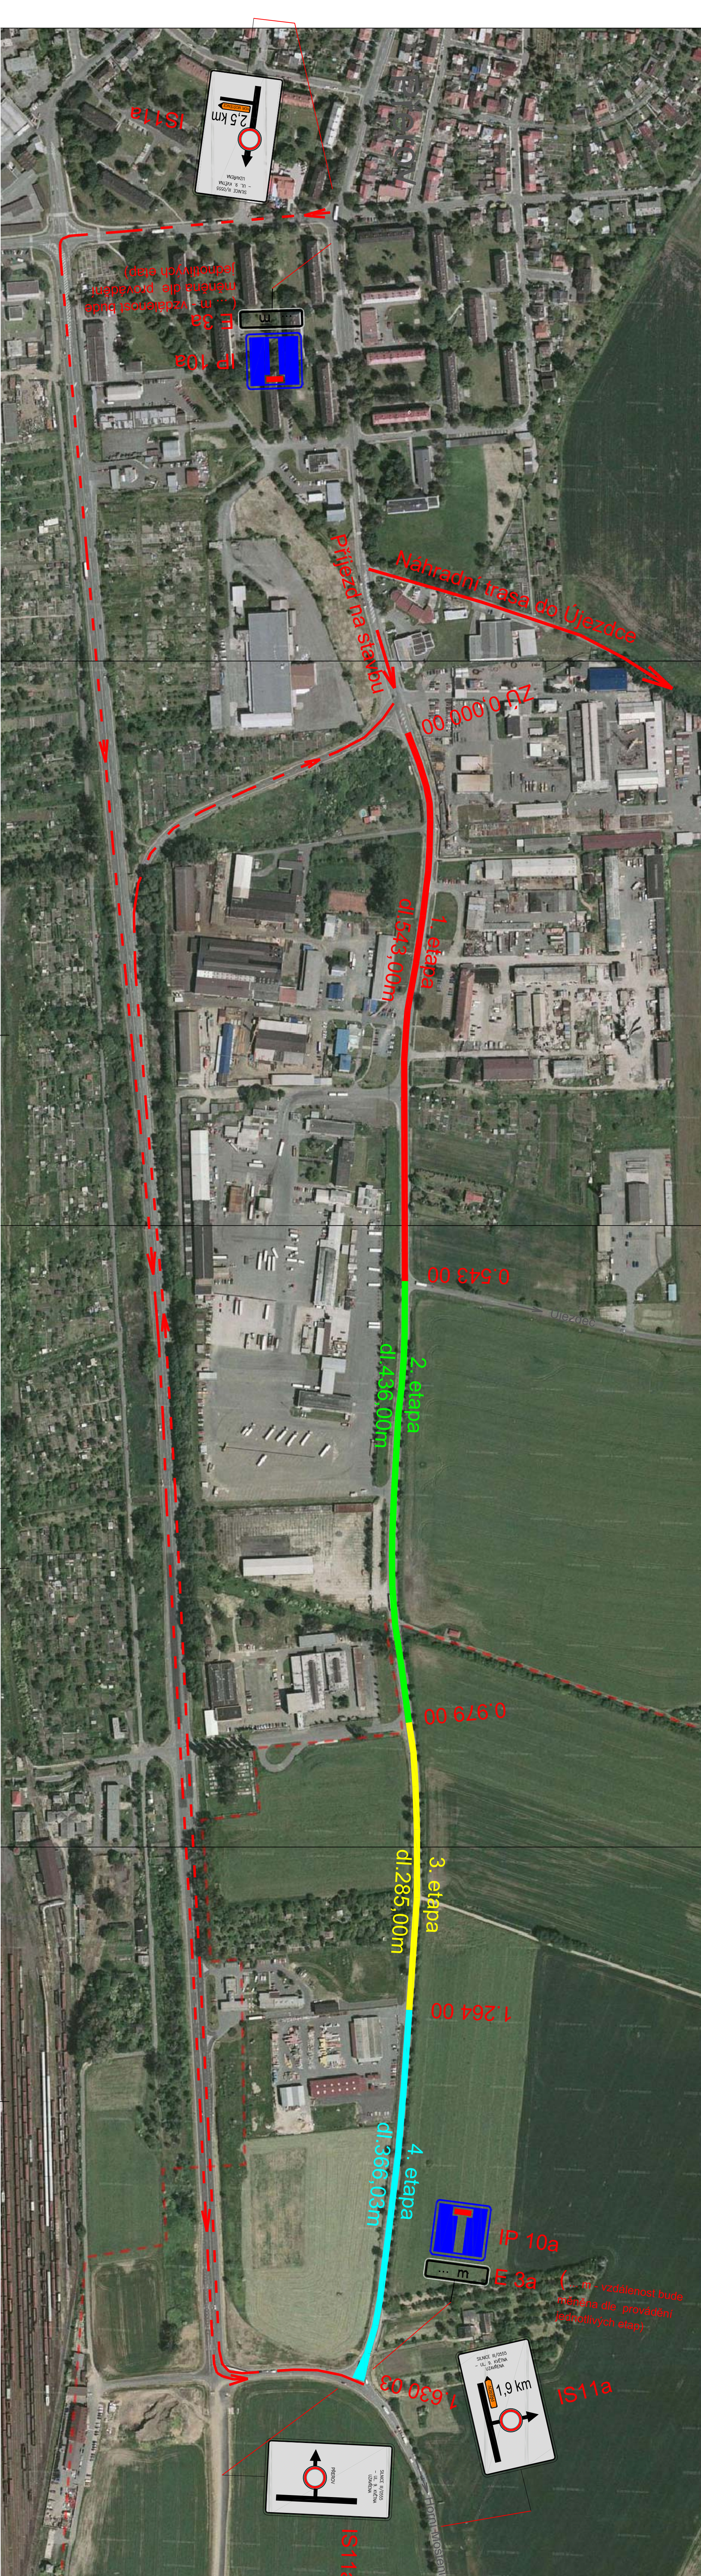

III/0555 PŘEROV, UL. 9. KVĚTNA	KOFIE:
UNĚSTĚNĚ: PŘEROV, UL. 9. KVĚTNA	
STAVEBNÍK: SPRÁVA SILNIC OLOMOUCKÉHO KRAJE, P.O., LPEŇSKÁ 120, 772 11 OLOMOUČ	
PROJEKTANT: PRINTES - ATELIER s.r.o., MOSTNÍ 1876/11a, 750 02 PŘEROV	
STUPEŇ PD: ZÁKAZKA:	DATAUM: LEDEN 2016
OSP-OPS	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKANT: KONTROLOVAL: Ing. Jan Štoký Ing. Jan Štoký	ZPRACOVAL: Ing. Jan Štoký
ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY	
PŘEHLEDNÁ SITUACE	M 1 : 2500
	VÝKRES: 001
